

Metodologia Utilizada1


A avaliação foi acelerada a fim de antecipar resultados

Metodologia e Etapas de Software Selection (plano original):



Nov, 2025 Mar, 2026 Abr, 2026

Etapas REALIZADAS (Gestão de Capex):




Nov, 2025 Jan, 2026 Fev, 2026 Mar, 2026

Outros projetos incorporados:



Oportunidades de sinergia (a ser avaliado):*

Visão Macro de Processos e Sistemas

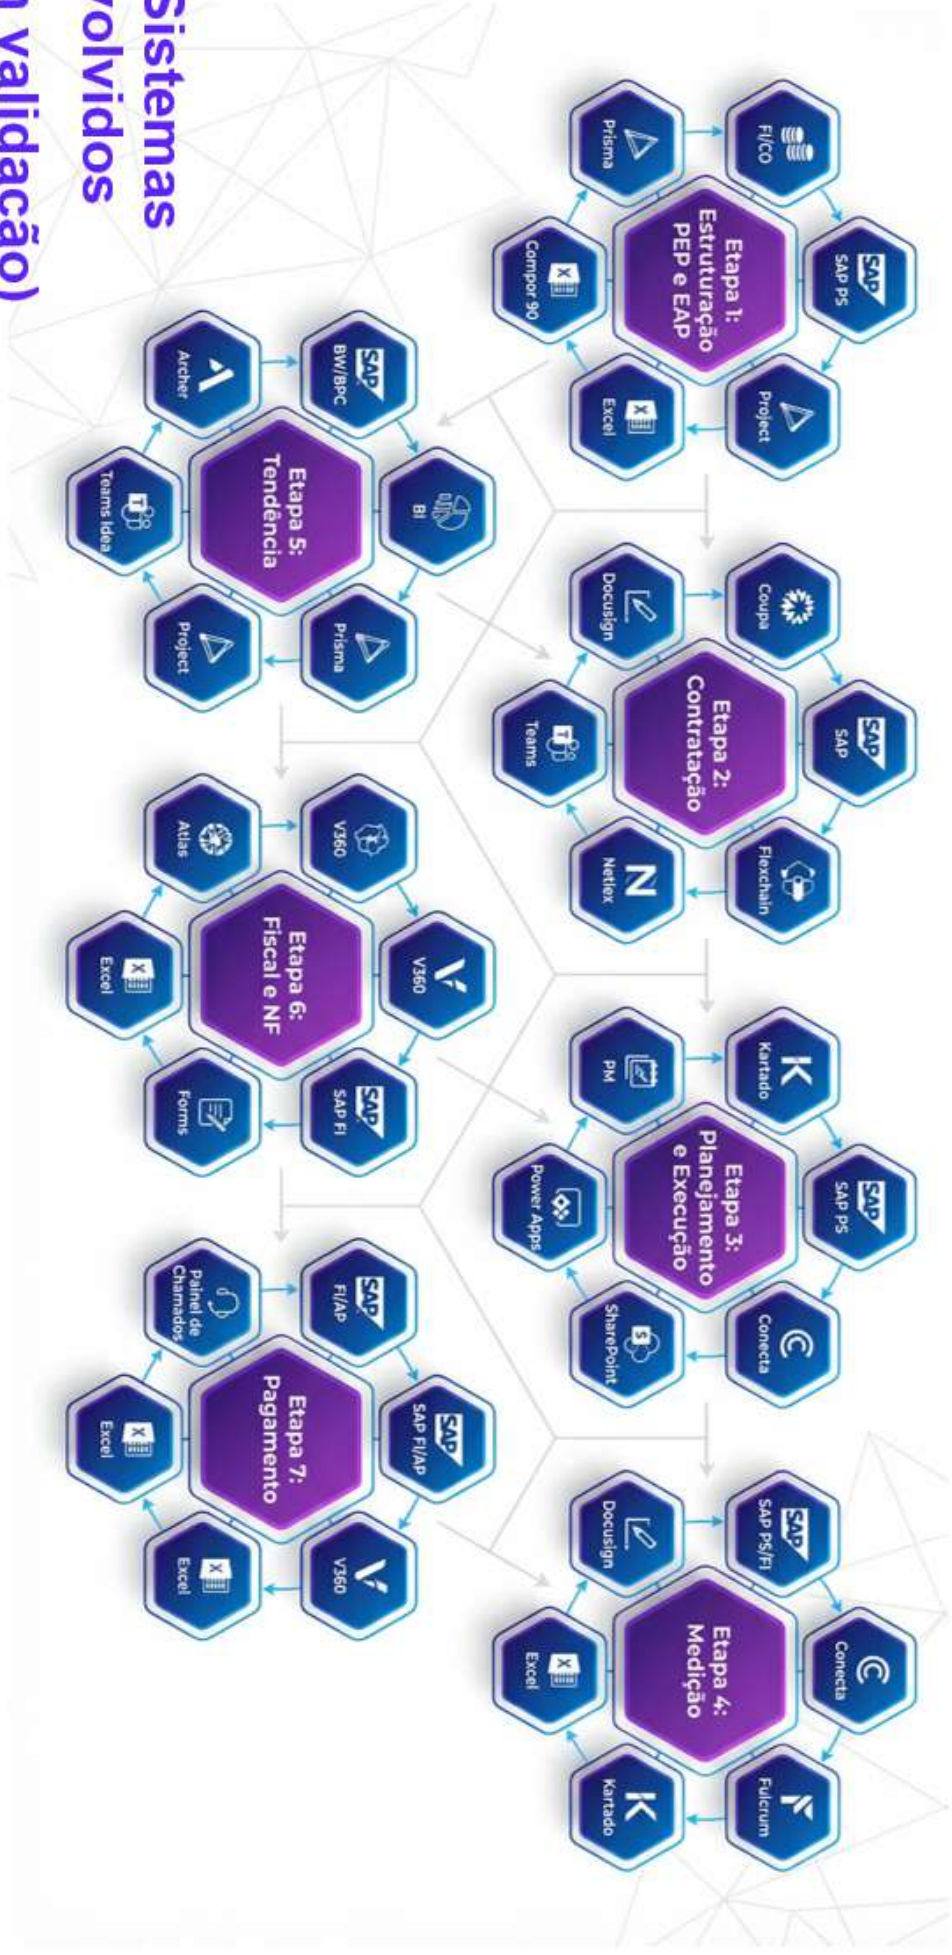

25 Sistemas Envolvidos
(Em validação)

Processos x Áreas – Outras Áreas

Área	Processo	Área	Processo
Núcleo Capex	Gestão do Capex	PMO TI	Criação de Elemento PEP
Núcleo Capex	Atualização Curva Iso Risco	PMO TI	Criação de Elemento PEP Filho
Núcleo Capex	Reunião quinzenal de Gestão de Risco	PMO TI	Carga de orçamento no PEP
Núcleo Capex	Definição de Orçamento	Facilities	Criação de PEP e Contratação
Núcleo Capex	Gestão do Capex - Orçamento	Facilities	Recebimento (Material)
Suprimentos	Orçamento, Negociação e Contratação	Facilities	Integração
Suprimentos	Criação de Contrato e Pedido de Compra	Facilities	Medição (Serviço)
Suprimentos	Aditivo contratual	Facilities	Tendência
Frotas	Estruturação do PEP	Segurança	Contratação de Serviços de Manutenção
Frotas	Medição produto	Segurança	Medição do Serviço Prestado
Frotas	Medição Serviços	Segurança	
Frotas	Compra sob demanda	Central de Medição	Central de Medição CSC - Medição de Serviços (CSC e Tecnologia)
Frotas	Compra Nova Concessão	CSC	Central de Medição
TI	Entrada da Demanda/Estruturação de PEP/Contratação	CSC	Medição de Serviços Jurídico-
TI	Medição - Serviço	Central de Medição	Processo de Liquidação da Conta 8
TI	Medição - Materiais	CSC	Entrada NF e Folha de Registro – Atribuição V360 (Automática ou Manual)
TI	Remanejamento de PEPs	Recebimento Integrado	Recebimento Integrado Entrada NF – Análise de Pendências V360
		Recebimento Integrado	Recebimento Integrado Entrada NF – Via SAP
		Recebimento Integrado	Recebimento Integrado Documentação Solidária
		Pagamentos	Pagamentos

Processos x Áreas - Trilhos

Área	Processo
Eng. Custos	Trilhos – Eng. Custos – Orçamento
Qualidade	Trilhos – Qualidade
Adm Contratual	Administração Contratual - Trilhos
PMO Financeiro	Criação PEP
PMO Financeiro	Camadas Folha de Medição
PMO Financeiro	Antecipação de Pagamento
PMO Financeiro	Bloqueio de Pagamento
PMO Financeiro	Desbloqueio de Pagamento
PMO Financeiro	Lançamentos Urgentes
PMO Financeiro	Adiantamento de Pagamento (Lançamento 19)
PMO Financeiro	Estorno de Pagamento - 19
PMO Financeiro	Regularização
PMO Financeiro	Contratos – Remanejamento
PMO Financeiro	Contratos – Encerramento
PMO Financeiro	Contratos – Reajuste
PMO Financeiro	Tendência
Projetos de Engenharia	Projeto de Engenharia e Centro de Expertise
GAC	Gestão Adm de contratos
PMO Obras	Trilhos
PMO Financeiro	IFRS
PMO Planejamento	Planejamento
PMO Planejamento	Gestão de Aditivos e Mudanças Contratuais
Engenharia	Desenvolvimento de Projetos
PMO Financeiro	Distribuição de Chamados

Processos x Áreas - Rodovias

Área	Processo
Engenharia Custo	Orçamentação Obras – Criação Requisição de Compras
Engenharia Custo	Revisão da Requisição de Compras
Engenharia Custo	Criação de Requisição de Compras por Aditivo de Contratos
Qualidade	Planejamento de Medição e qualidade
Qualidade	Qualidade e Inspeção
Qualidade	Fluxo de Não Conformidade
Qualidade	Gestão de Não Conformidade
Qualidade	Data Book
PMO Unidades	Estruturação do Capex
PMO Unidades	Gestão do Capex e Atualização de Tendência
PMO Unidades	Medição
PMO Unidades	Antecipação Financeira
PMO Unidades	Adiantamento
PMO Unidades	Caução
PMO Unidades	Aditivo
PMO Unidades	Faturamento Direto
PMO Unidades	Faturamento Direto - Ressarcimento
PMO Consolidador	Criação de Elemento PEP (PQQ ou não orçada)
PMO Consolidador	Revisão PEPs criados (PQQ)
PMO Consolidador	Provisão de Manutenção (PQQ)
PMO Consolidador	Monitoramento de Tendência Econômico – (PS)
PMO Consolidador	Monitoramento de Tendência Físico
PMO Consolidador	Construção do Orçamento (Rodovias)
PMO Consolidador	Monitoramento de Tendência Financeiro

Área	Processo
Engenharia	Implantação
Obras Via Oeste	Planejamento de Medição
Obras Via Oeste	Execução da Obra e Lançamento da Medição
Obras Via Oeste	Medições (com ou sem aprovação qualidade)
Conservação	Planejamento prévio da medição
Conservação	Gestão da Medição
Conservação	Troca de NF
Conservação	Criação da RC conforme Contrato (CAPEX e OPEX)
Obra Serra das Araras	Medição
Obra Serra das Araras	Não Conformidade
Operação PCO	(Planejamento e Controle da Operação)
Operação PCO	Emergencial ou Descentralizado até 10 mil
Manutenção	Equipamentos e sistemas- Preventiva
Manutenção	Equipamentos e sistemas- Sob Demanda
Pré Obra	Pré-Obra

Soluções Potenciais

Existem 4 grandes grupos de soluções possíveis para a cadeia de valor em discussão

Macro Processos / Aplicações	Novos Negócios & Demandas	Orçamento	Estruturação & (Planejamento & Custo)	Contratação	Execução (Detalhamento do Planejamento)	Medição	Tendência	Fiscal (NF)	Pagamento	Observações
	Da abertura, definição da demanda à aprovação	Definição e aprovação dentro da estrutura de custos da Motiva	Planejamento Físico, Econômico e Financeiro	Gestão de contratos, incluindo Requisição de Compra, Pedido, Aditivos, Garantia, Penalidades, Auditoria	Gestão de Prazos e de avanços, Gestão da mudança de projeto, Gestão de Pieltos, Auditoria	Boletim de medição, RDO, Vant, Técnica, V. Financeira, Workflow de aprovação, Qualidade, Controle de Custo	Projeção das medições do físico, econômico e financeiro, Gestão de Risco	Processo Fiscal entre Motiva x Fornecedor para pagamento	Pagamento e Conciliação	
Oracle - Primavera Cloud										Já usado em trilhos para gestão de obras
Oracle - Unifier										Integração nativa com OPC, cases limitados
Hexagon - Ecosys										Em avaliação
Construtivo - Colaborativo										Em avaliação
SAP PPM										Poucos cases no Brasil
Bentley ProjectWise										Usado atualmente, suporte limitado no Brasil
Solução Custom / Dados		2								Cases Vale, Rumo, Energia
Autodesk Construction Cloud						3				Solução em avaliação
IBM Planning										Já usado para Opex e parte do Capex
Oracle Hyperion Planning										Demandaria nova implantação
SAP SAC Planning										Demandaria nova implantação
V360										Solução já usada, com potencial de expansão
SAP DRC									4	Seria um upgrade

Legenda: 1 Soluções end-to-end com foco em engenharia 2 Soluções com foco em planejamento financeiro 3 Soluções complementares para medição 4 Soluções com foco em fiscal e pagamentos



Aplicações Motiva – AS IS

Há mais de 25 aplicações em uso, algumas a serem descontinuadas e os processos não tem padrão

Macro Processos / Aplicações	N. Negócios & Demandas		Orçamento		Estruturação (Para, A, Como)		Contratação		Execução (Declar, do Para,)		Medição	Tendência	Fiscal (NF)	Pagamento	Principais funcionalidades Aplicações
	C	C	T												
TEAMS IDEIAS															Orçamento de Demandas
POWERAPP	T.R. não submissões														Abertura de demandas para trilhos
ARCHER (RISCOS)	RTC														Gestão de Riscos (Governança)
EXCEL / SHAREPOINT / PROJECT	RTC	RTC			RTC				RTC						Controles manuais e não integrados
SAP ECC		RTC	RTC		RTC	RTC	RTC	RTC	RTC	RTC	RTC	RTC	RTC	RTC	Controles e gestão econômica e financeira e integradas
DATALAKE+POWERBI		RTC			RTC				RTC						Dashboards e Relatórios
ORACLE PRIMAVERA CLOUD					T				T						Gestão de Obra
CONECTA					T				T		T			T	Controle de workflows de chamados
IBM PLANNING (PRISMA)		RTC										RTC			Orçamento (Opex), Complemento Capex, Tendência financeiro, Amortização e Depreciação. Hoje não tem realizado de capex (no nível PEP)
PROJECT ONLINE (PPM) *					RTC				RTC		RTC				Estruturação de PEP e os planejamentos e medições feitos em Excel e refletidos na aplicação Project Online
COMPOR 90			R		R										Custo pelo DNTF para simular orçamento, usado para alguns projetos
DOCSIGN									RTC		RTC				Assinatura Digital
FLEXCHAIN		R							RTC						Aprovações MP, NP e RD, ativo com terceiros e análises técnicas.
BENNER					RTC				RTC						ERP do Jurídico (desapropriação, desapropriação, somente judicializado)
SPD (DELIBERAÇÃO DE PROPOSTAS)															Aprovações Diretoria (deliberação de propostas)
NETLEX									RTC						Confecção de contratos
COUPA									RTC						Gestão de Fornecedores integrado com ERP
ALTAS - LOGISTICA									RTC					RTC	Bloqueio e modifmpt. de fornecedores. Renda acessória (seguro garantia selffunding)
FULCRUM (MEDIÇÃO EMPREITEIRAS)															RDO e Boletins de Obras Empreiteiras - Medição empreiteiras (Biro Ventas)
KARTADO											R				RDO de Rodovias (cont. de horas, funcionários), só usado por equipe de conservação
PROJECT WISE											R				Gestão de Obra
AUTODESK											R				Gestão de obra, Gestão de ativo físico
PDM											R				Gestão de Obra
V360											T				Validação e Emissão, Parcelamento de NF

* Será descontinuada em SET/2026

Legenda:

Plataformas no escopo
Nível de Uso

Alto Uso Médio Uso Baixo Uso

Falta mapear Softexpert



Fonte: Análise Motiva com base em informações disponibilizadas pelos áreas. A análise não é exaustiva.

Visão da cadeia de valor e resumo dos requisitos

Os requisitos estão focados na integração e padronização dos processos e dados

Novos Negócios & Demandas	Orçamento	Estruturação (Planejamento & Custo)	Contratação	Execução (Detalhamento do Planejamento)	Medição	Tendência	Fiscal (NF)	Pagamento
Da abertura, definição da demanda à aprovação	Definição e aprovação dentro da estrutura de custos da Motiva	Planejamento Físico, Econômico e Financeiro	Gestão de contratos incluindo Requisição de Compra, Pedido, Aditivos, Garantia, Penalidades, Auditoria	Gestão de Prazos e de avanços. Gestão da mudança de projeto, Gestão de Pleitos, Auditoria	Boletim de medição, RDO (R. Diário de Obra), Validação Técnica e Financeira, Workf de aprovação, Qualidade, Inspeções, Controle de Custo	Projeção das medições do físico, econômico e financeiro, Gestão de Risco	Processo fiscal entre Motiva x Fornecedor para pagamento	Pagamento e Conciliação

Estudo		Foco Consultoria Engenharia							
	Agilidade de análise com padronização do estudo das novas demandas	Estruturação do organismo centralizado para auxiliar na agilidade da estruturação	Padronização, organização e governança das estruturas de projetos, ciclo de compras	Melhorar governança sobre Contratos, Pedidos e Requisições de compra com padronizações para facilitar planejamento e execução	Visão unificada do processo para potencializar a produtividade	Centralização de todas as informações dos projetos e sua execuções (Boletim de Medição, RDO e Memória de Cálculo) e eliminação de trabalhos manuais	Visão integrada dos processos, integrando visões dos avanços físico, econômico e financeiro com tendência centralizada e automática	Processo de Emissão e Recebimento NF com uma visão do geral do fiscal entre Motiva x Fornecedor para efetuar o pagamento	Processo fiscal para facilitar conciliação de pagamentos de fornecedores
Requisitos negócio									

Requisito Sistêmico	
	Integração entre os sistemas com rastreabilidade de ponta a ponta, redução de ações manuais e maior eficiência
